



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



Национальный проект «Здравоохранение»

**Федеральный проект
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
Достижение результатов по итогам 1 квартала 2020 года**

Администратор проекта: Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ».
СОЗДАНИЕ ФАП, ФП, ВА В 2019 ГОДУ

В Российской Федерации в 2019 году планировалось
создание **393 ФАП, ФП, ВА**

РЕЗУЛЬТАТ:

Созданы/заменены более 1 550 новых
фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов, врачебных амбулаторий

Показатель

Число ФАП/ВА: запланировано

создано дополнительно
за счет экономии на закупках

Финансирование

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2019

Введено в эксплуатацию
по состоянию на 31.12.2019

Введено в эксплуатацию
по состоянию на 20.05.2020

Получили лицензии по состоянию на 20.05.2020
(контрольная точка, плановая дата – 31.05.2020)

На ФАП, ФП, ВА начато осуществление
медицинской деятельности

Российская Федерация

393 ед. }
39 ед. } **432 ед.**

1,7 млрд рублей

1,64 млрд рублей (96,8%)

415 ед.

428 ед.  4 ФАП – Владимирская область

344 объекта в 55 субъектах

10,4 тыс. посещений – до 31.12.2019

75,19 тыс. посещений – по состоянию на 01.05.2020

7 субъектов
57 объектов

По состоянию на 01.05.2020

Строительно-монтажные
работы завершены

Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

Объект недвижимого
имущества введен
в эксплуатацию

Государственная
регистрация права
на объект недвижимого
имущества произведена

Плановая дата
30.09.2019

Плановая дата
30.10.2019

Плановая дата
15.11.2019

Плановая дата
10.12.2019

Не завершены по 4 объектам во Владимирской области.
Также государственная регистрация права не получена
на 18 объектов из 21

Не произведена
7 субъектами, 57 объектов:

- Республики Адыгея (1)
- Архангельская область (1)
- Владимирская область (18)
- Московская область (14)
- Нижегородская область (5)
- Рязанская область (14)
- Челябинская область (4)

В соответствии с оперативными данными **по состоянию на 20.05.2020** государственная регистрация права произведена на объекты:

в Республике Адыгея (1), Архангельской (1), Московской (14), Нижегородской (5), Рязанской (14), Челябинской областях (4); во Владимирской области – регистрация права произведена на 14 из 21 ФАП

Подтверждающие письма о закрытии КТ не предоставлены

РЕЗУЛЬТАТ:

Функционируют более 1550 созданных/
замененных в 2019-2020 ФАП, ФП, ВА

Материально-техническое (кадровое)
обеспечение

31.03.2020

Отчет ОИВ

**По состоянию на 01.05.2020 не достигнута
10 субъектами в отношении 33 объектов**

- Республика Дагестан (5 из 20 ФАП, ФП)
- Республика Калмыкия (4 из 12 ФАП)
- Краснодарский край (1 из 6 ФАП)
- Приморский край (4 из 11 ФАП)
- Астраханская область (1 из 4 ФАП)
- Владимирская область (9 из 21 ФАП)
- Костромская область (1 из 4 ФАП)
- Новгородская область (2 из 10 ФАП, ВА)
- Сахалинская область (1 из 4 ФАП)
- Челябинская область (5 из 13 ФАП)

**Причина – не подготовлено кадровое обеспечение, поздние
процедуры закупок оборудования и мебели**

В соответствии с оперативными данными **по состоянию
на 20.05.2020 КТ закрыта** Костромской областью

Подтверждающее письмо о закрытии КТ не предоставлено

Получены лицензии
на осуществление
медицинской деятельности

31.05.2020

Отчет ОИВ

Начато оказание
медицинской помощи

31.12.2020

Отчет ОИВ



**Своевременное
предоставление
информации о закрытии
контрольных точек**

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения



РЕЗУЛЬТАТ:

Введено в действие **более 40** фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

Мероприятие реализовано Министерством сельского хозяйства РФ

В 2019 году было запланировано введение в действие 53 ФАП и офисов врачей общей практики в 35 субъектах Российской Федерации

По состоянию на 31.12.2019 введено в действие **53 ФАП** и офисов врачей общей практики в **35 субъектах** Российской Федерации

На 20.05.2020 получены лицензии на осуществление медицинской деятельности **на 35 объектов** в **21 субъекте**



РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ».
ПРИБРЕТЕНИЕ ПМК В 2019 ГОДУ

В Российской Федерации в 2019 году планировалось
приобретение **501 ПМК**

РЕЗУЛЬТАТ:

Приобретено более
1 300 передвижных медицинских
комплексов

Показатель

Число ПМК: запланировано

приобретено дополнительно
за счет экономии на закупках

Финансирование

Кассовый расход по состоянию на 20.02.2019

Поставлено ПМК в МО **состоянию на 31.12.2019**

Поставлено ПМК в МО **по состоянию на 20.05.2020**

Поставлено ПМК на учет в ГИБДД по состоянию на 20.05.2020

Осуществлено выездов в 2019 году

Осмотрено человек

Осуществлено выездов в 2020 году, по состоянию на 01.05.2020

Осмотрено человек

Российская Федерация

501 ед.
18 ед. } **519 ед.**

4,0 млрд рублей

3,96 млрд рублей (98,9%)

502 ед.

516 ед. Иркутская область (1 из 17)
Курганская область (2 из 16)

512 ед.

7,3 тыс. выездов

158,5 тыс. человек

12,08 тыс. выездов

251,14 тыс. человек

В 2020 году (по состоянию на 01.05.2020) не начата выездная деятельность 34 ПМК из 516 поставленных в медицинские организации в 10 субъектах РФ

Не поставлены на учет в ГИБДД

4 ПМК в 2 субъектах

- Красноярский край (2 ПМК из 35)
- Московская область (2 ПМК из 8 ПМК)

Не начата выездная деятельность

30 ПМК в 9 субъектах

- Чувашская Республика (2 из 18)
- Красноярский край (4 из 35)
- Владимирская область (1 из 13)
- Костромская область (4 из 15)
- Новгородская область (4 из 42)
- Орловская область (3 из 10)
- Ростовская область (1 из 24)
- Смоленская область (9 из 27)
- Тульская область (2 из 4)

34 ПМК в 10 субъектах

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» В 2020 ГОДУ

Национальный проект «Здравоохранение»



312,5 млрд рублей

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»



15,1 млрд рублей

1. Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения

- 1.1. Функционируют **432** ФП, ФАП, ВА, созданных в 2019 году
- 1.2. Созданы/заменены более **1200** ФП, ФАП, ВА. Объем ИМБТ – **5,7 млрд рублей**
- 1.3. Функционируют **519** приобретенных в 2019 году передвижных медицинских комплексов
- 1.4. Приобретено более **500** передвижных медицинских комплексов. Объем ИМБТ – **3,8 млрд рублей**
- 1.5. Выполнено не менее **8 500** вылетов санитарной авиации (дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ), эвакуировано не менее 10 600 чел. Объем субсидии – **5,46 млрд рублей**
- 1.6. Построены (реконструированы) **82** вертолетные площадки

2. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

- 2.1. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» участвуют не менее **54,7%** медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи (**5 123** медицинских организации)
- 2.2. Обеспечено тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях, подведомственных ФМБА России. Объем субсидии – **50 млн рублей**

3. Формирование системы защиты прав пациентов

- 3.1. Обеспечен охват **48,5%** застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра
- 3.2. Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании

В Российской Федерации в 2020 году запланировано
создание/замена **1 227 ФАП, ФП, ВА** в **71 субъекте**

РЕЗУЛЬТАТ:

Функционируют более 1550 созданных/замененных
в 2019-2020 ФАП, ФП, ВА

Земельный участок предоставлен
заказчику
По состоянию на 20.05.2020

Получены положительные заключения
по результатам государственных экспертиз

Получено
разрешение
на строительство



КТ отсутствует в 2020 году



15.05.2020



30.05.2020

Предоставлены заказчикам
1 076 земельных участков
в 71 субъекте

**Не предоставлены
земельные участки
для создания 151 объекта
в 20 субъектах**

Отчеты ОИВ о получении положительного заключения
по результатам государственных экспертиз

Не выполнена 14 субъектами в отношении 195 объектов

Карачаево-Черкесская Республика (17 из 17)
Республика Коми (19 из 19)
Республика Марий Эл (17 из 17)
Республика Тыва (26 из 26)
Удмуртская Республика (34 из 88)
Чеченская Республика (6 из 6)
Архангельская область (10 из 10)

Владимирская область (24 из 38)
Курская область (7 из 8)
Магаданская область (3 из 3)
Московская область (7 из 13)
Нижегородская область (3 из 3)
Новосибирская область (18 из 18)
Тамбовская область (4 из 6)

Отчет ОИВ о получении
разрешения
на строительство
(реконструкцию)

Опубликованы извещения о проведении конкурсных процедур на 785 объектов (64%) в 46 субъектах

Заключены контракты на создание/замену 457 ФАП, ФП, ВА (37,2%) в 34 субъектах

**Контроль качества предоставляемой информации в системе оперативного мониторинга
Минздрава России. Своевременное предоставление информации о закрытии контрольных точек**

Заключены соглашения с **23 субъектами** Российской Федерации

В **2020 году** запланировано приобретение **501 ПМК**

РЕЗУЛЬТАТ:

Приобретено более
1 300 передвижных медицинских
комплексов

Показатель	Российская Федерация
Число ПМК (запланировано)	501 ед.
Финансирование	3,8 млрд рублей
Опубликованы извещения о проведении конкурсных процедур по состоянию на 20.05.2020	256 ПМК ? Причины для задержки опубликования извещений
Из них заключены государственные контракты по состоянию на 20.05.2020	198 ПМК
Поставлено в медицинские организации по состоянию на 20.05.2020	22 (Республика Мордовия – 20 ПМК, Тюменская область 2 ПМК)

**Не опубликованы извещения о проведении конкурсных процедур
по состоянию на 20.05.2020 на 245 ПМК в 14 субъектах**

- Республика Бурятия (36 из 36)
- Республика Дагестан (54 из 54)
- Республика Карелия (1 из 9)
- Республика Крым (6 из 10)
- Забайкальский край (6 из 33)
- Волгоградская область (2 из 13)
- Воронежская область (3 из 38)
- Кемеровская область (29 из 29)
- Новосибирская область (7 из 13)
- Оренбургская область (37 из 37)
- Самарская область (19 из 32)
- Тамбовская область (7 из 10)
- Ульяновская область (31 из 31)
- Челябинская область (7 из 10)

В Российской Федерации в 2020 году запланировано осуществить
8 504 вылета, эвакуировать 10 663 человека

РЕЗУЛЬТАТ:

Осуществлено более **8 500** вылетов санитарной авиации (дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ)

Показатель
Осуществлено вылетов, ед. по состоянию на 21.05.2020
Эвакуировано человек
в том числе детей

Российская Федерация
2 731 (32% от плана на 2020 год)
3 654 (34% от плана на 2020 год)
606

В 2019-2020 гг. в субъектах РФ запланировано строительство **82 вертолетных площадок**



Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

в сфере охраны здоровья Республики Адыгея (1), Архангельской (1), Владимирской (14), Иркутской (1), Курганской (2), Московской (14), Нижегородской (5), Рязанской (14), Челябинской (4) областей:

Во исполнение п. 17 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 13.11.2019 № ДМ-П-78пр:

Обеспечить предоставление информации о введении ФАП, ФП, ВА в эксплуатацию, производстве государственной регистрации права на объект недвижимого имущества, передаче ПМК в медицинские организации **1 раз в неделю по четвергам** на электронный адрес cpmsp@rosminzdrav.ru

При невыполнении контрольных точек в плановые сроки **оперативно предоставлять отчеты** на электронный адрес cpmsp@rosminzdrav.ru при их выполнении



1. Проанализировать причины недостижения в 2019 году результатов и показателей федерального проекта



2. Принять исчерпывающие меры по достижению результатов и показателей федерального проекта в 2020 году, обеспечив:

- укомплектование ФАП, ФП, ВА, созданных/замененных в 2019 году, медицинскими кадрами,
- подготовку и своевременное получение лицензий на ФАП, ФП, ВА, созданные/замененные в 2019 году,
- эффективное и рациональное использование передвижных медицинских комплексов, исполнение планов-графиков выездной работы передвижных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году



3. Обеспечить оперативное предоставление отчетов при закрытии контрольных точек федерального проекта



4. Усилить контроль качества предоставления информации в автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики Минздрава России (asmms.mednet.ru)




1. Мероприятия по снижению рисков недостижения результатов федерального проекта

- активное **использование заказчиками типовой экономически эффективной проектной документации** повторного использования
- **формирование технических заданий** на закупку передвижных медицинских комплексов **с учетом наличия соответствующей информации о зарегистрированных медицинских изделиях в Государственном реестре медицинских изделий и организаций** (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, опубликованном на официальном сайте Росздравнадзора



2. Постоянный контроль за исполнением контрольных точек, достижением целевых показателей региональных сегментов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Благодарю за внимание!

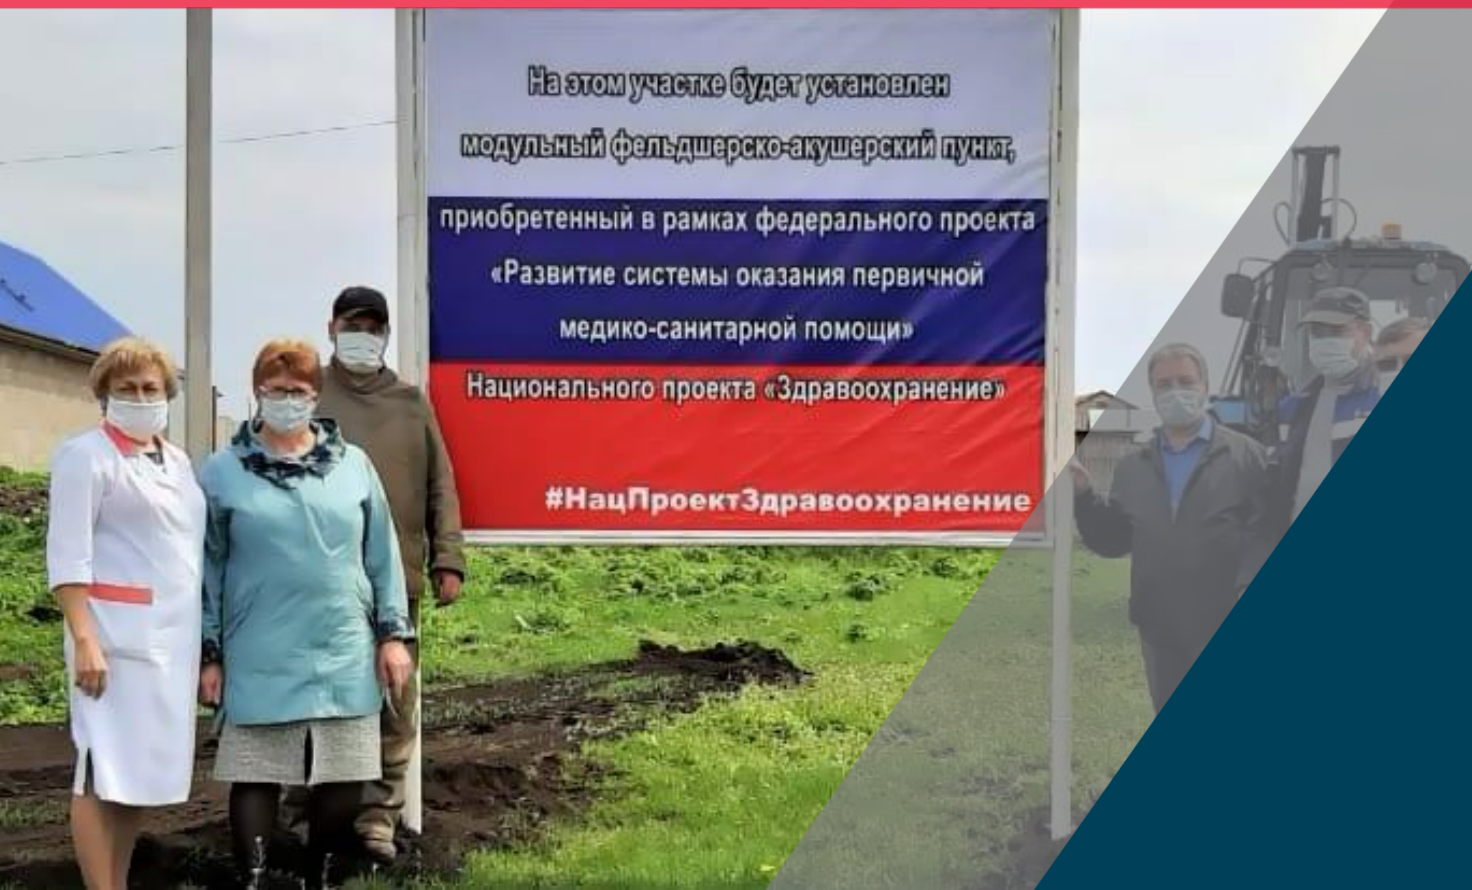

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
